ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Submittals	28 days	Mon 10/3/22	Wed 11/9/22
2	Erosion Control & Locates	2 days	Wed 2/1/23	Thu 2/2/23
3	Mobilization, Traffic Control	2 days	Fri 2/3/23	Mon 2/6/23
4	Survey	2 days	Tue 2/7/23	Wed 2/8/23
5	Pipe Delivery	1 day	Thu 2/9/23	Thu 2/9/23
6	Valve Assembly	1 day	Fri 2/10/23	Fri 2/10/23
7	Mainline	12 days	Mon 2/13/23	Tue 2/28/23
8	Services	6 days	Wed 3/1/23	Wed 3/8/23
9	Hydrants	1 day	Thu 3/9/23	Thu 3/9/23
10	Blow-offs ARVs	2 days	Fri 3/10/23	Mon 3/13/23
11	Testing	3 days	Tue 3/14/23	Thu 3/16/23
12	Abandonments and Tie-ins	6 days	Fri 3/17/23	Fri 3/24/23
13	18" Line stops and Iso valves	3 days	Mon 3/27/23	Wed 3/29/23
14	Grind and Inlay dependent on Temp	2 days	Mon 3/27/23	Tue 3/28/23
15	Cleanup De-Mobe	2 days	Thu 3/30/23	Fri 3/31/23

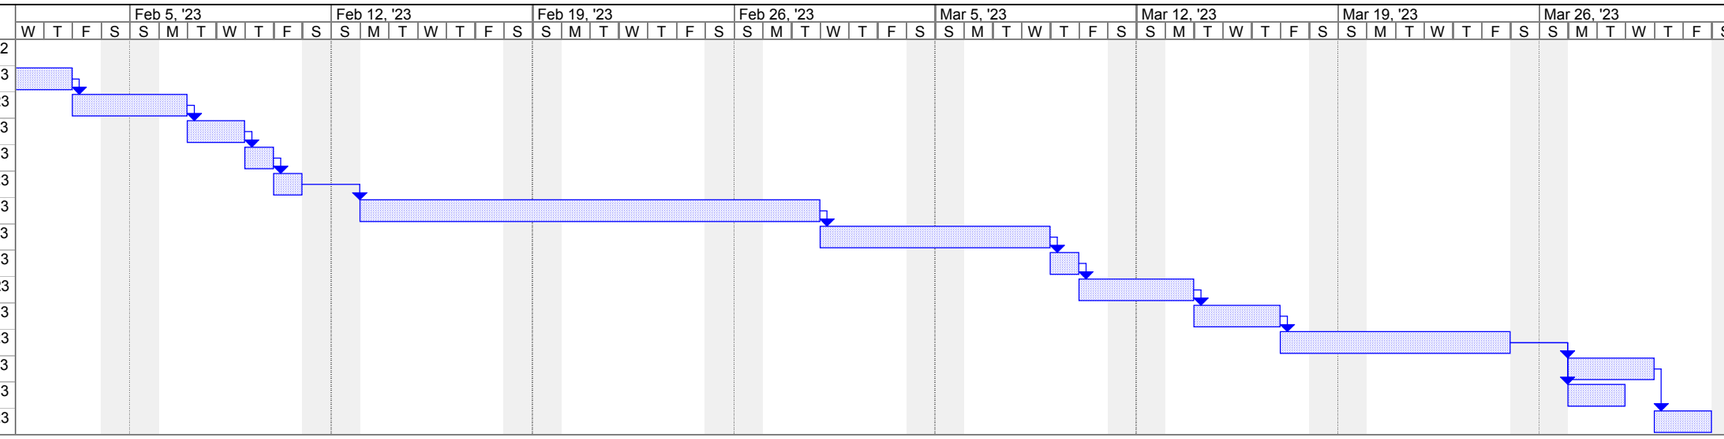

Project: Newberg N College Water Sch
Date: Tue 1/10/23

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
